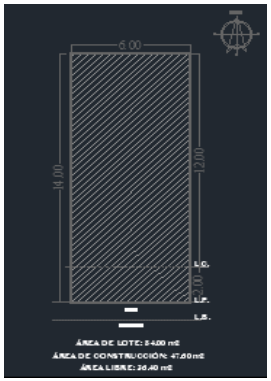
ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS		**ESPECIFICACION**	**1E**
1.0 PRELIMINARES	**1.01** Localizaciòn y replanteo	**UNIDAD**	M2

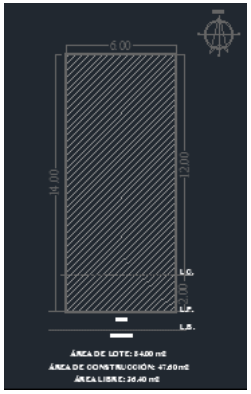
REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Localizaciòn y replanteo entre ejes	14,00	6,00	-	12,00	1.008,00
	Total					**1.008,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS		**ESPECIFICACION**	**2E**
1.0 PRELIMINARES	**1.02** Cerramiento provisional en tela verde, altura: 2,10Mts	**UNIDAD**	M

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Cerramiento provisional en tela verde	74,00	32,00	2,00	1,00	106,00
	Total					**106,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS		**ESPECIFICACION**	**3E**
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS	**2.01** Excavación manual en material común para cimentación. Incluye retiro.	**UNIDAD**	M

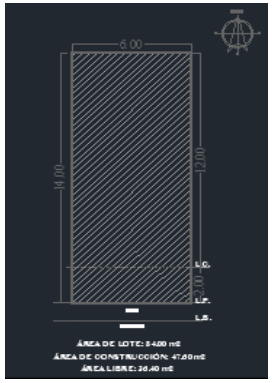
REGISTRO FOTOGRAFICO	**DESCRIPCION**	**MEDIDAS**			**CANTIDA**	**SUBTOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**		
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 1	2,85	-	-	12,00	34,20
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 2	2,85	-	-	12,00	34,20
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 3	2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 4	2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 1"	2,95	-	-	12,00	35,40
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 2"	2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 3"	2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 4"	2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 5"	5,70	-	-	12,00	68,40
	Viga de cimentaciòn longitudinal eje A	14,00	-	-	12,00	168,00
	Viga de cimentaciòn longitudinal eje B	8,45	-	-	12,00	101,40
	Viga de cimentaciòn longitudinal eje C	14,00	-	-	1,00	14,00
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 1"	5,70	-	-	12,00	68,40
	Total					**689,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS		**ESPECIFICACION**	**4E**
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS	2.**02** Relleno de material seleccionado compactado. Incluye transporte.	**UNIDAD**	M3

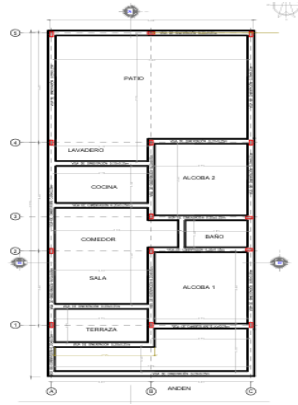
REGISTRO FOTOGRAFICO	**DESCRIPCION**	**MEDIDAS**			**CANTIDA**	**SUBTOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**		
	Relleno de material seleccionado compactado, área interna	7,50	5,80	0,40	12,00	522,00
	Relleno de material seleccionado compactado, terraza	2,85	0,80	0,40	12,00	27,36
	Relleno de material seleccionado compactado, acceso	1,30	1,30	0,20	12,00	20,28
	Total					**569,64**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**5E**
3.0 ESTRUCTURA	**ITEM**	**3,01** Concreto de 3000PSI para viga de cimentaciñon0.30Mts. X 0,30Mts	**UNIDAD**	**M**

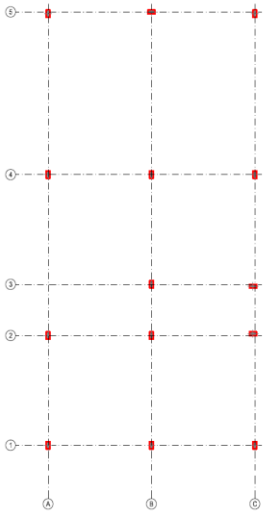
REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION		MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 1		2,85	-	-	12,00	34,20
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 2		2,85	-	-	12,00	34,20
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 3		2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 4		2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 1'		2,95	-	-	12,00	35,40
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 2"		2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 3"		2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 4"		2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 5"		5,70	-	-	12,00	68,40
	Viga de cimentaciòn longitudinal eje A		14,00	-	-	12,00	168,00
	Viga de cimentaciòn longitudinal eje B		8,45	-	-	12,00	101,40
	Viga de cimentaciòn longitudinal eje C		14,00	-	-	1,00	14,00
	Viga de cimentaciòn Transversal eje 1"		5,70	-	-	12,00	68,40
	Total						**689,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**6E**
3.0 ESTRUCTURA	**ITEM**	**3.02** Concreto de 3000PSI para columnas de confinamiento de 0.10Mts x 0.20Mts	**UNIDAD**	M

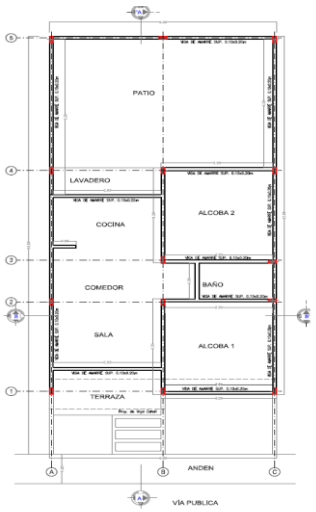
REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Columnas de confinamiento de 0.10Mts x 0.20Mts	3,10	-	-	25,00	77,50
	Columnas de confinamiento de 0.10Mts x 0.20Mts	3,62	-	-	25,00	90,50
	Columnas de confinamiento de 0.10Mts x 0.20Mts	3,37	-	-	24,00	80,88
	Columnas de confinamiento de 0.10Mts x 0.20Mts	2,20	-	-	50,00	110,00
	Total					**358,88**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**7E**
3.0 ESTRUCTURA	**ITEM**	**3.03** Concreto de 3000PSI para viga de amarre superior de 0.10Mts x 0.20Mts.	**UNIDAD**	M

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION		MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Viga de amarre superior eje 1		2,85	-	-	12,00	34,20
	Viga de amarre superior eje 2		2,85	-	-	12,00	34,20
	Viga de amarre superior eje 3		2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de amarre superior eje 4		2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de amarre superior eje 1'		2,95	-	-	12,00	35,40
	Viga de amarre superior eje 2"		2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de amarre superior eje 3"		2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de amarre superior eje 4"		2,75	-	-	12,00	33,00
	Viga de amarre superior eje 5"		5,70	-	-	12,00	68,40
	Viga de amarre superior eje A		14,00	-	-	12,00	168,00
	Viga de amarre superior eje B		8,45	-	-	12,00	101,40
	Viga de amarre supeiior eje C		14,00	-	-	1,00	14,00
	Total						**620,60**


PLANTA VIGAS DE AMARRE SUPERIO
Escala 1:50

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**8E**
3.0 ESTRUCTURA	**ITEM**	**3.04** Concreto de 3000PSI para viga culata de 0.10Mts x 0.10Mts.	**UNIDAD**	M

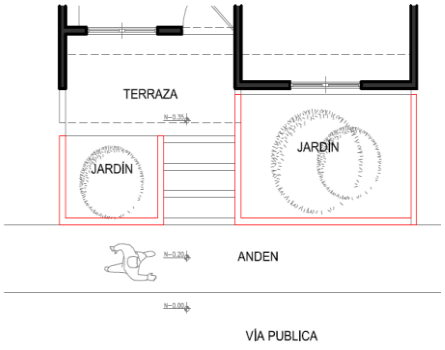
REGISTRO FOTOGRAFICO	**DESCRIPCION**	**MEDIDAS**			**CANTIDA**	**SUBTOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**		
	Viga culata eje A de 0.10Mts x 0.15Mts.	6,80	-	-	12,00	81,60
	Viga culata eje C de 0.10Mts x 0.15Mts.	6,80	-	-	1,00	6,80
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Total					**88,40**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**9E**
3.0 ESTRUCTURA	**ITEM**	**3.05** Concreto de 3000PSI para viga jardín de 0.10Mts x 0.10Mts.	**UNIDAD**	M

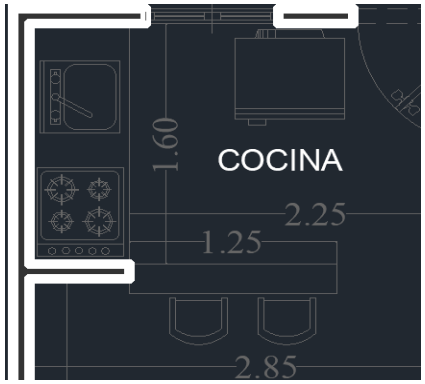
REGISTRO FOTOGRAFICO	**DESCRIPCION**	**MEDIDAS**			**CANTIDA**	**SUBTOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**		
	Viga jardin eje A de 0.10Mts x 0.20Mts.	1,30			12,00	15,60
	Viga jardin eje A" de 0.10Mts x 0.20Mts.	1,30			12,00	15,60
	Viga jardin eje 1' de 0.10Mts x 0.20Mts.	4,40			12,00	52,80
	Viga jardin eje B de 0.10Mts x 0.20Mts.	1,30			12,00	15,60
	Viga jardin eje C de 0.10Mts x 0.20Mts.	1,90			1,00	1,90
	Total					**101,50**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**10E**
3.0 ESTRUCTURA	**ITEM**	**3.06** Concreto de 3000PSI losa de entrepaños para soporte de lavaplatos. e = 0.10Mts	**UNIDAD**	M


REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Losa de entrepaños para soporte de lavaplatos. e = 0.10Mts	1,60	-	-	12,00	19,20
		1,25			12,00	15,00
	Total					**34,20**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**11E**
3.0 ESTRUCTURA	**ITEM**	**3.07** Concreto de 3000PSI para viga canal, e = 0,12Mts	**UNIDAD**	M

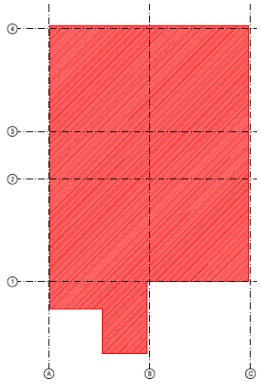
REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Concreto de 3000PSI para viga canal, e = 0,12Mts	3,05	1,00	-	12,00	36,60
	Concreto de 3000PSI para viga canal, e = 0,12Mts	2,95	0,50	-	12,00	17,70
	Total					**54,30**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**12E**
3.0 ESTRUCTURA	**ITEM**	**3.08** Concreto de 3000PSI para plantilla, e = 0,07Mts; reforzada conmalla electrosoldada	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Plantilla, e = 0,07Mts; reforzada conmalla electrosoldada	7,50	5,80	-	12,00	522,00
	Plantilla, e = 0,07Mts; reforzada conmalla electrosoldada	2,85	0,80	-	12,00	27,36
	Plantilla, e = 0,07Mts; reforzada conmalla electrosoldada	1,30	1,30	-	12,00	20,28
	Total					**529,08**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	#¡REF!
3.0 ESTRUCTURA	**ITEM**	**3.11** Acero de 60000PSI de refuerzo.	**UNIDAD**	#¡REF!

DESCRIPCION	Ø	LONGITUD	# ELEMENTO	# VARILLA	LONG TTAL	LONG STAND	CANTIDAD Ø	Kg X Mt	PESO
Viga de carga para viga canal	½	6,00	1,00	4,00	24,00	6,00	4,00	1,00	24,00
Estribos Viga de carga para viga canal	⅜	0,75	1,00	30,00	22,50	6,00	3,75	0,56	12,60
Viga de cimentaciòn Transversal eje 1	½	2,75	1,00	4,00	11,00	6,00	1,83	1,00	11,00
Estribos Viga de cimenntacion transversal eje 1	⅜	0,75	1,00	13,75	10,31	6,00	1,72	0,56	5,78
Viga de cimentaciòn Transversal eje 2	½	2,75	1,00	4,00	11,00	6,00	1,83	1,00	11,00
Estribos Viga de cimentaciòn transversal eje 2	⅜	0,75	1,00	13,75	10,31	6,00	1,72	0,56	5,78
Viga de cimentaciòn Transversal eje 3	½	2,75	1,00	4,00	11,00	6,00	1,83	1,00	11,00
Estribos viga de cimentaciòn Transversal eje 4	⅜	0,75	1,00	13,75	10,31	6,00	1,72	0,56	5,78
Viga de cimentaciòn Transversal eje 4	½	2,75	1,00	4,00	11,00	6,00	1,83	1,00	11,00
Estribos viga de cimentaciòn Transversal eje 5	⅜	0,75	1,00	13,75	10,31	6,00	1,72	0,56	5,78
Viga de cimentaciòn Transversal eje 1"	½	2,95	1,00	4,00	11,80	6,00	1,97	1,00	11,80
Estribos viga de cimentaciòn Transversal eje 1"	⅜	0,75	1,00	14,75	11,06	6,00	1,84	0,56	6,20
Viga de cimentaciòn Transversal eje 2"	½	2,75	1,00	4,00	11,00	6,00	1,83	1,00	11,00
Estribos viga de cimentaciòn Transversal eje 2"	⅜	0,75	1,00	13,75	10,31	6,00	1,72	0,56	5,78
Viga de cimentaciòn Transversal eje 3"	½	2,75	1,00	4,00	11,00	6,00	1,83	1,00	11,00
Estribos viga de cimentaciòn Transversal eje 3"	⅜	0,75	1,00	13,75	10,31	6,00	1,72	0,56	5,78
Viga de cimentaciòn Transversal eje 4"	½	2,75	1,00	4,00	11,00	6,00	1,83	1,00	11,00
Estribos viga de cimentaciòn Transversal eje 4"	⅜	0,75	1,00	13,75	10,31	6,00	1,72	0,56	5,78
Viga de cimentaciòn Transversal eje 5"	½	5,60	1,00	4,00	22,40	6,00	3,73	1,00	22,40
Estribos viga de cimentaciòn Transversal eje 5"	⅜	0,75	1,00	28,00	21,00	6,00	3,50	0,56	11,76
Viga de cimentaciòn longitudinal eje A	½	13,03	1,00	4,00	52,12	6,00	8,69	1,00	52,12
Estribos viga de cimentaciòn longitudinal eje A	⅜	0,75	1,00	65,15	48,86	6,00	8,14	0,56	27,36
Viga de cimentaciòn longitudinal eje B	½	7,35	1,00	4,00	29,40	6,00	4,90	1,00	29,40
Estribos viga de cimentaciòn longitudinal eje B	⅜	0,75	1,00	36,75	27,56	6,00	4,59	0,56	15,44
Viga de cimentaciòn longitudinal eje C	½	13,03	1,00	4,00	52,12	6,00	8,69	1,00	52,12
Estribos viga de cimentaciòn longitudinal eje C	⅜	0,75	1,00	65,15	48,86	6,00	8,14	0,56	27,36
Viga de cimentaciòn longitudinal eje B"	½	1,10	1,00	4,00	4,40	6,00	0,73	1,00	4,40
Estribos viga de cimentaciòn longitudinal eje B"	⅜	0,75	1,00	5,50	4,13	6,00	0,69	0,56	2,31
Viga de amarre superior eje A de 0.10Mts x 0.20Mts.	½	4,50	1,00	4,00	18,00	6,00	3,00	1,00	18,00
Estribos viga de amarre superior eje A de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	0,50	1,00	22,50	11,25	6,00	1,88	0,56	6,30
Viga de amarre superior eje B de 0.10Mts x 0.20Mts.	½	6,00	1,00	4,00	24,00	6,00	4,00	1,00	24,00
Estribos viga de amarre superior eje B de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	0,50	1,00	30,00	15,00	6,00	2,50	0,56	8,40
Viga de amarre superior eje C de 0.10Mts x 0.20Mts.	½	3,00	1,00	4,00	12,00	6,00	2,00	1,00	12,00
Estribos viga de amarre superior eje C de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	0,50	1,00	15,00	7,50	6,00	1,25	0,56	4,20
Viga de amarre superior eje 1" de 0.10Mts x 0.20Mts.	½	5,00	1,00	4,00	20,00	6,00	3,33	1,00	20,00
Estribos viga de amarre superior eje 1" de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	0,50	1,00	25,00	12,50	6,00	2,08	0,56	7,00

Viga de amarre superior eje 2 de 0.10Mts x 0.20Mts.	½	6,00	1,00	2,00	12,00	6,00	2,00	1,00	12,00
Estribos viga de amarre superior eje 2 de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	0,50	1,00	30,00	15,00	6,00	2,50	0,56	8,40
Viga de amarre superior eje 3 de 0.10Mts x 0.20Mts.	½	2,00	1,00	2,00	4,00	6,00	0,67	1,00	4,00
Estribos viga de amarre superior eje 3 de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	0,50	1,00	10,00	5,00	6,00	0,83	0,56	2,80
Viga de amarre superior eje 3' de 0.10Mts x 0.20Mts.	½	1,00	1,00	4,00	4,00	6,00	0,67	1,00	4,00
Estribos viga de amarre superior eje 3' de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	0,50	1,00	5,00	2,50	6,00	0,42	0,56	1,40
Viga de amarre superior eje 3" de 0.10Mts x 0.20Mts.	½	6,00	1,00	4,00	24,00	6,00	4,00	1,00	24,00
Estribos viga de amarre superior eje 3" de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	0,50	1,00	30,00	15,00	6,00	2,50	0,56	8,40
Viga de amarre superior eje 4 de 0.10Mts x 0.20Mts.	½	3,30	1,00	4,00	13,20	6,00	2,20	1,00	13,20
Estribosviga de amarre superior eje 4 de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	0,50	1,00	16,50	8,25	6,00	1,38	0,56	4,62
Columnas tipo 1 de 0,20Mts x 0,15Mts	½	2,75	9,00	4,00	99,00	6,00	16,50	1,00	99,00
Estribos columna tipo 1	⅜	0,50	9,00	18,33	82,50	6,00	13,75	0,56	46,20
Columnas tipo 2 de 0,20Mts x 0,15Mts	½	2,70	5,00	6,00	81,00	6,00	13,50	1,00	81,00
Estribos columna tipo 2	⅜	0,50	5,00	18,00	45,00	6,00	7,50	0,56	25,20
Viga cinta eje A de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	11,20	1,00	3,00	33,60	6,00	5,60	0,56	18,82
Estribo sviga cinta eje A de 0.10Mts x 0.20Mts.	¼	0,50	1,00	56,00	28,00	6,00	4,67	0,26	7,28
Viga cinta eje B de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	6,90	1,00	3,00	20,70	6,00	3,45	0,56	11,59
Estribos viga cinta eje B de 0.10Mts x 0.20Mts.	¼	0,50	1,00	34,50	17,25	6,00	2,88	0,26	4,49
Viga cinta eje C de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	11,10	1,00	3,00	33,30	6,00	5,55	0,56	18,65
Estribos viga cinta eje C de 0.10Mts x 0.20Mts.	¼	0,50	1,00	55,50	27,75	6,00	4,63	0,26	7,22
Viga cinta eje 2 de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	2,85	1,00	3,00	8,55	6,00	1,43	0,56	4,79
Estribos viga cinta eje 2 de 0.10Mts x 0.20Mts.	¼	0,50	1,00	14,25	7,13	6,00	1,19	0,26	1,85
Viga cinta eje 3 de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	2,85	1,00	3,00	8,55	6,00	1,43	0,56	4,79
Estribos viga cinta eje 3 de 0.10Mts x 0.20Mts.	¼	0,50	1,00	14,25	7,13	6,00	1,19	0,26	1,85
viga culata eje 3" de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	2,85	1,00	3,00	8,55	6,00	1,43	0,56	4,79
Estribos viga culata eje 3" de 0.10Mts x 0.20Mts.	¼	0,50	1,00	14,25	7,13	6,00	1,19	0,26	1,85
viga culata eje 4 de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	2,85	1,00	3,00	8,55	6,00	1,43	0,56	4,79
Estribos viga culata eje 4 de 0.10Mts x 0.20Mts.	¼	0,50	1,00	14,25	7,13	6,00	1,19	0,26	1,85
Viga jardin eje B de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	2,00	1,00	3,00	6,00	6,00	1,00	0,56	3,36
Estribos viga jardin eje B de 0.10Mts x 0.20Mts.	¼	0,50	1,00	10,00	5,00	6,00	0,83	0,26	1,30
Viga jardin eje C de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	2,00	1,00	3,00	6,00	6,00	1,00	0,56	3,36
Estribos viga jardin eje C de 0.10Mts x 0.20Mts.	¼	0,50	1,00	10,00	5,00	6,00	0,83	0,26	1,30
Viga jardin eje 1' de 0.10Mts x 0.20Mts.	⅜	3,05	1,00	3,00	9,15	6,00	1,53	0,56	5,12
Estribos viga jardin eje 1·" de 0.10Mts x 0.20Mts.	¼	0,50	1,00	15,25	7,63	6,00	1,27	0,26	1,98
Malla electrosoldada de 15 x 15 de 4mm		48,72	1,00	3,46	-	-	3,46	42,20	145,81

Total Kg	**1.107,65**

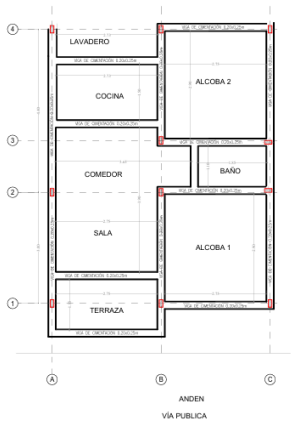
Total ø ½	97,41	**98,00**	**98,00**
Total ø ⅜	103,10	**103,00**	**57,68**
Total ø ¼	19,85	**20,00**	**5,20**
Malla electrosoldada de 15 x 15 de 4mm	3,46	**4,00**	**168,80**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**14E**
4.0 MAMPOSTERIA	**ITEM**	**4.01** Sobrecimiento de 4 hiladas en bloque macizo acostado de 0.10Mts x 0.20Mts x 0.40Mts.	**UNIDAD**	M

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn Transversal eje 1	2,75	-	-	12,00	33,00
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn Transversal eje 2	2,75			12,00	33,00
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn Transversal eje 3	2,75			12,00	33,00
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn Transversal eje 4	2,75			12,00	33,00
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn Transversal eje 1"	2,95			12,00	35,40
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn Transversal eje 2"	2,75			12,00	33,00
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn Transversal eje 3"	2,75			12,00	33,00
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn Transversal eje 4"	2,75			12,00	33,00
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn Transversal eje 5"	5,60			12,00	67,20
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn longitudinal eje A	13,03			12,00	156,36
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn longitudinal eje B	7,35			12,00	88,20
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn longitudinal eje C	13,03			1,00	13,03
	Sobrecimiento 4H, viga de cimentaciòn longitudinal eje B"	1,10			12,00	13,20
	Total					**604,39**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**15E**
4.0 MAMPOSTERIA	**ITEM**	**4.02** Levante de muro enladrillo Nº 6, rallado, rojo de 0,10Mts x 0,20Mts x 0,40Mts	**UNIDAD**	**M2**


REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Muro en eje A, en bloque hueco 0.10	14,00	-	2,80	2,00	78,40
	Muro en eje B, en bloque hueco 0.10	6,80	-	2,80	12,00	228,48
	Muro en el eje 1" en bloque hueco.10	2,85	-	2,80	12,00	95,76
	Muro en el eje 2 en bloque hueco.10	2,85	-	2,80	12,00	95,76
	Muro en el eje 3 en bloque hueco.10	2,85	-	2,80	12,00	95,76
	Muro en el eje 3' en bloque hueco.10	0,60	-	2,80	12,00	20,16
	Muro en el eje 3" en bloque hueco.10	2,85	-	2,80	12,00	95,76
	Muro en el eje 4 en bloque hueco.10	2,85	-	2,80	12,00	95,76
	Muro en el eje 5 en bloque hueco.10	6,00	-	2,80	12,00	201,60
	Cuchilla muro en eje A, en bloque hueco 0.10	2,25		0,80	12,00	0,90
	Cuchilla muro en eje A, en bloque hueco 0.10	4,45		0,85	12,00	1,89
	Cuchilla eje B	6,40	-	0,80	12,00	61,44
	Cuchilla eje 2	2,85	-	0,80	12,00	27,36
	Cuchilla eje 3	2,85	-	0,80	12,00	27,36
	Cuchilla eje 3"	2,85	-	0,80	12,00	27,36
	Cuchilla eje 4	2,85	-	0,80	12,00	27,36
	Cuchilla eje B	6,40	0,80	2,00	12,00	30,72
	Vano puertas	-	0,90	2,10	12,00	22,68
	Vano puertas	-	0,80	2,00	12,00	19,20
	Vano puertas	-	0,70	2,00	12,00	16,80
	Vano ventanas	-	1,20	1,20	12,00	17,28
	Total					**1.135,87**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**16E**
4.0 MAMPOSTERIA	**ITEM**	**4.03** Levante de muro en ladrillo Nº 4, rallado, rojo de 0,15Mts x 0,20Mts x 0,40Mts	**UNIDAD**	**M2**

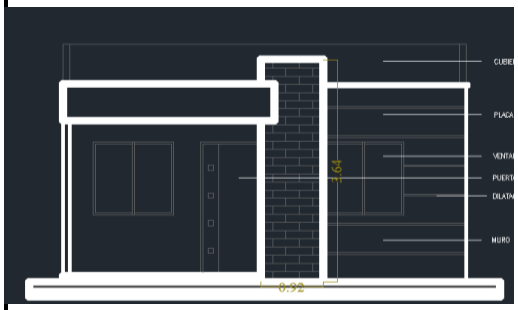
REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Muro en eje C, en bloque hueco 0.15	2,25	-	2,80	11,00	69,30
	Muro en eje C, en bloque hueco 0.15	4,45	-	2,80	11,00	137,06
	Cuchilla eje C en bloque hueco.15	2,25	0,75	2,00	11,00	0,84
	Cuchilla eje C en bloque hueco.15	4,50	0,85	2,00	11,00	1,91
	Total					**209,12**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**0**
4.0 MAMPOSTERIA	**ITEM**	**4.03** Levante de muro en ladrillo Nº 4, rallado, rojo de 0,15Mts x 0,20Mts x 0,40Mts	**UNIDAD**	**0**

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Muro de fachada en ladrillo tolete	-	0,92	3,64	12,00	40,19
	Total					**40,19**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS			**ESPECIFICACION**	**17E**
4.0 MAMPOSTERIA	**ITEM**	**4.04** Pañete con mortero 1:5, para muros divisorios, perimetrales y cuchillas.	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Pañete con mortero 1:5, para muros .10	1.135,87	-	-	2,00	2.271,74
	Pañete con mortero 1:5, para muros .15	209,12			2,00	418,24
	Total					**2.689,98**

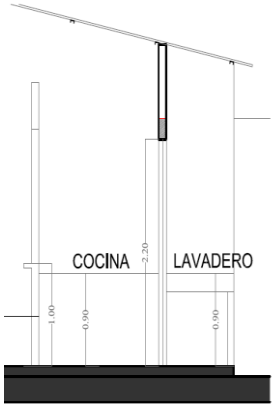
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

5.0 PISOS Y ENCHAPES	**ITEM**	**5.01** Suministro e instalacion de ceramica antideslizante blanca, de 0,20Mts x 0,30Mts, para cocina, baño y labores	**UNIDAD**	Mt^2

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Instalacion de ceramica antideslizante para cocina.	1,95	1,60	-	12,00	37,44
	Instalacion de ceramica antideslizante para baño.	1,95	1,20	-	12,00	28,08
	Instalacion de ceramica antideslizante para labores	2,85	0,90	-	12,00	30,78
	Total					**96,30**

1.155,60

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

5.0 PISOS Y ENCHAPES	**ITEM**	**5.02** Instalacion de enchape para cocina y baño	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Instalacion de enchape para cocina.	4,20	-	1,00	12,00	50,40
	Instalacion de enchape para baño	2,60	-	2,00	12,00	62,40
	Instalacion de enchape para labores	1,50	-	1,00	12,00	18,00
	Total					**130,80**

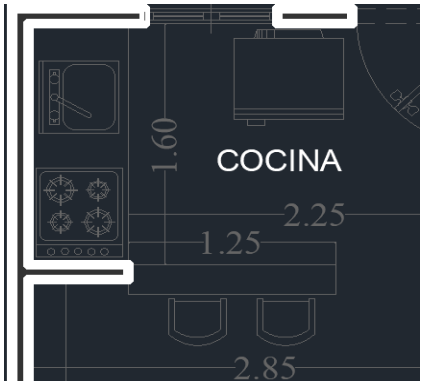
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

5.0 PISOS Y ENCHAPES	**ITEM**	**5.03** Placa de concreto para meson de cocina y despensa	**UNIDAD**	0

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Meson de concreto cocina	1,60	-	-	12,00	19,20
	Meson para barra	1,25	-	-	12,00	15,00
	Total					**34,20**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

6.0 CUBIERTA	**ITEM**	**6.01** Suministro e instalacion de tubo cuadrado estructural 2,00mm de 70 * 70 incluye pintura anticorrosiva dos manos y esmalte sintetico 2 manos	**UNIDAD**	KG

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		PESO	ANCHO	ALTURA		
	Suministro e instalacion de tubo cuadrado estructural	26,10	-	-	120,00	3.132,00
	Total					**3.132,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

6.0 CUBIERTA	**ITEM**	**6.02** Suministro e instalacion de cubierta en fibro-cemento perfil 7	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Suministro e instalacion de cubierta en fibro-cemento P7	2,60	6,00	-	12,00	187,20
	Suministro e instalacion de cubierta en fibro-cemento P7	4,75	6,00	-	12,00	342,00
	Total					**529,20**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

CARPINTERIA METALICA	**ITEM**	**7.01** Suministro e instalacion de puerta de 2,10Mts x 0,90Mts, entamborada, en lámina calibre 18	**UNIDAD**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Puerta de 2,10Mts x 0,90Mts, en lámina calibre 18		0,90	2,10	24,00	24,00
	Total					**24,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

CARPINTERIA METALICA	**ITEM**	**7.02** Suministro e instalacion de puerta de 2,10Mts x 0,70Mts, entamborada, en lámina calibre 18	**UNIDAD**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Puerta de 2,10Mts x 0,70Mts, en lámina calibre 18	1,00	-	-	12,00	12,00
	Total					**12,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	**ITEM**	**7.03** Suministro e instalacion de ventana con vidrio trasparente de 4mm, en perfilería en aluminio blanco de	**UNIDAD**	25E

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Ventana con vidrio trasparente de 4mm, aluminio blanco	1,20	-	1,20	48,00	69,12
	Total					**69,12**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	**ITEM**	**8.01** Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable, incluye griferia para lavaplatos, incluye acce	**UNIDAD**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Lavaplatos, incluye accesorios de instalacion	1,00	-	-	12,00	12,00
	Total					**12,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	**ITEM**	**8.02** Suministro e instalación de tubería de presión PVC RDE 21 ø 1 "	**UNIDAD**	M

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	tubería de presión PVC RDE 21 ø 1 "	21,00	-	-	12,00	252,00
	Total					**252,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	**ITEM**	**8.03** Suministro e instalación de tubería PVC de 2"	**UNIDAD**	M

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Tubería PVC de 2"	12,00	-	-	12,00	144,00
	Total					**144,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	**ITEM**	**8.04** Suministro e instalación de tubería PVC de 4"	**UNIDAD**	0

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Tubería PVC de 4"	6,00	-	-	12,00	72,00
	Total					**72,00**

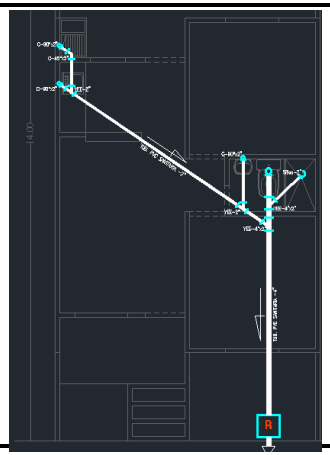
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	**ITEM**	**8.05 Punto sanitarios** PVC de 2"	**UNIDAD**	0

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		UNIDAD	ANCHO	ALTURA		
		4,00	-	-	12,00	48,00
	Total					**48,00**

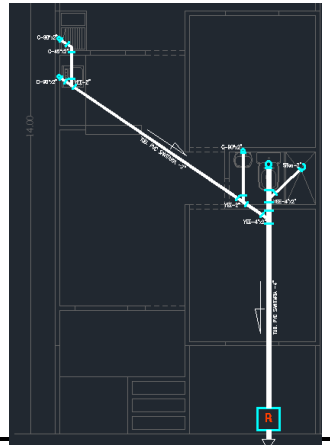
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	**ITEM**	**8.06 Punto sanitarios** PVC de 4"	**UNIDAD**	0

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		UNIDAD	ANCHO	ALTURA		
		1,00	-	-	12,00	12,00
	Total					**12,00**

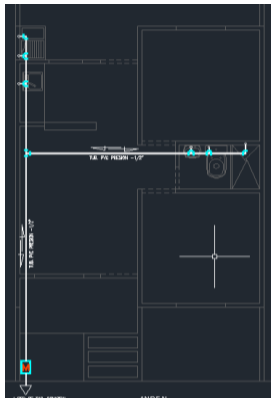
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	**ITEM**	**8.07 Punto HIDRAULICOS**	**UNIDAD**	0

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		UNIDAD	ANCHO	ALTURA		
		6,00	-	-	12,00	72,00
	Total					**72,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	**ITEM**	**8.08** Suministro e instalación de tubería PVC de aguas lluvias 4"	**UNIDAD**	0

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Tubería PVC de 4"	9,00	-	-	12,00	108,00
	Total					**108,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	**ITEM**	**8.09** Suministro e instalación de combo sanitario, color blanco	**UNIDAD**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		N° ELEMENTO	ANCHO	ALTURA		
	Combo sanitario, color blanco	1,00	-	-	12,00	12,00
	Total					**12,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	**ITEM**	**8.10** Suministro e instalación de Lavadero prefabricado granito pulido 0,80 x 0,60 x 0,25; Incluye accesorios.	**UNIDAD**	0

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		N° ELEMENTO	ANCHO	ALTURA		
	Lavadero prefabricado granito pulido 0,80 x 0,60 x 0,25	1,00	-	-	12,00	12,00
	Total					**12,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES ELECTRICES	**ITEM**	**9.01** Suministro e instalacion de tablero bifasico 6 circuitos con compuerta, 220/127V, 125 AMP**.**	**UNIDAD**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		N° ELEMENTO	ANCHO	ALTURA		
	Tablero bifasico 6 circuitos, compuerta 220/127V 125 AMP.	1,00	-	-	12,00	12,00
	Total					**12,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES ELECTRICES	**ITEM**	**9.02** Salida para toma doble de 20V, 15A, tuberia EMT, cable #12	**UNIDAD**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		N° ELEMENTO	ANCHO	ALTURA		
	Toma doble de 20V, 15A, tuberia EMT, cable #12	9,00	-	-	12,00	108,00
	Total					**108,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES ELECTRICES	**ITEM**	**9.03** Salida para luminaria de sobreponer en tuberia EMT, cable #12	**UNIDAD**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		N° ELEMENTO	ANCHO	ALTURA		
	Salida luminaria de sobreponer en tuberia EMT, cable #12	11,00	-	-	12,00	132,00
	Total					**132,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES ELECTRICES	**ITEM**	**9.04** Suministro e instalacionde Breaker enchufable 1x20, 10KA	**UNIDAD**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		N° ELEMENTO	ANCHO	ALTURA		
	Breaker enchufable 1x20, 10KA	6,00	-	-	12,00	72,00
	Total					**72,00**

SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES ELECTRICES	**ITEM**	**9,05** Suministro e instalacion de panel led de sobreponer de 18W, 120V	**UNIDAD**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		N° ELEMENTO	ANCHO	ALTURA		
	Panel led de sobreponer de 18W, 120V	9,00	-	-	12,00	108,00
	Total					**108,00**

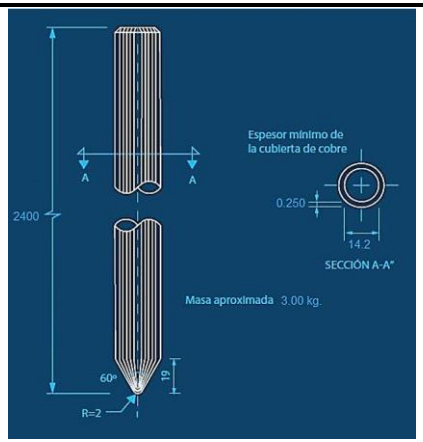
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES ELECTRICES	**ITEM**	**9,06** Puesta a tierra con varilla cooperwelld de 5/8" x2.50 mts y cable de cobre desnudo #4	**UNIDAD**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		N° ELEMENTO	ANCHO	ALTURA		
	Varilla cooperwelld de 5/8" x2.50Mts cab de cobre #4	1,00	-	-	12,00	12,00
	Total					**12,00**

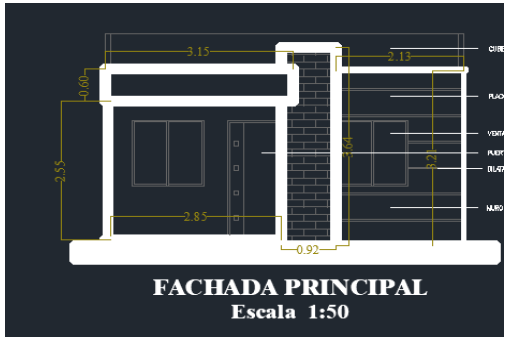
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

SECRETRARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL URBANO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

INSTALACIONES ELECTRICES	**ITEM**	**10,01 Graniplas para fachada**	**UNIDAD**	0

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDA	SUBTOTAL
		N° ELEMENTO	LARGO	ALTURA		
	Muro de fachada	1,00	3,15	0,60	12,00	22,68
		2,00	2,85	2,55	12,00	87,21
		3,00	2,13	3,21	12,00	82,05
	Total					**191,94**

SUPERVISOR
