
Pozo:

PZ4

Proyecto: Red de alcantarillado EBAR
Empresa: RINCIVIL
No. Contrato:
Fecha: 18/06/2026



Foto Panorámica

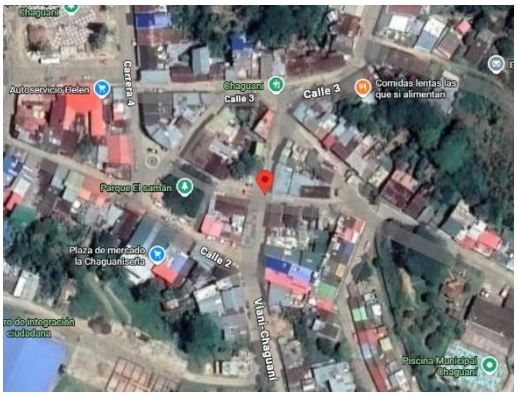

Ubicación

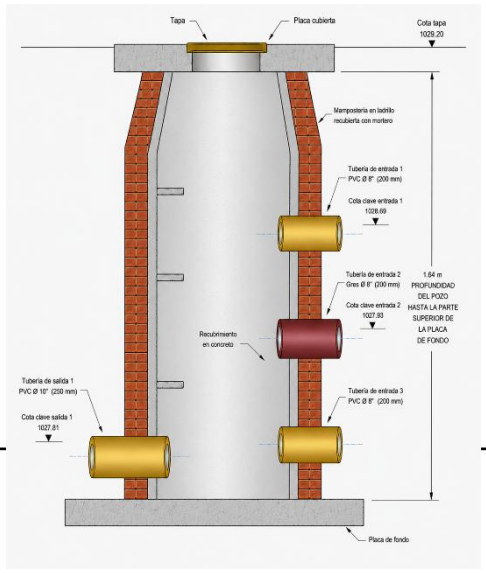


Foto externa de pozo



Foto interna de pozo

ESQUEMA DE PERFIL DEL POZO



CARACTERÍSTICAS DEL POZO	
Dirección:	Carrera 2
Tipo de sistema:	Sanitario
Tapa:	Si
Tipo de tapa:	Concreto circular
Estado de tapa:	Bueno
Placa cubierta:	Si
Tipo de placa cubierta:	Concreto
Estado placa cubierta:	Bueno
Cañuela:	No visible
Pasos:	No visible
Estado de pasos:	No visible
Estado de pozo:	Bueno


Pozo:

PZ4

Proyecto: Red de alcantarillado EBAR
Empresa: RINCIVIL
No. Contrato:
Fecha: 18/06/2026

COORDENADAS	
Norte:	2105075.874
Este:	4823342.608
Cota Rasante:	1029.200

ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN DE TUBERÍAS

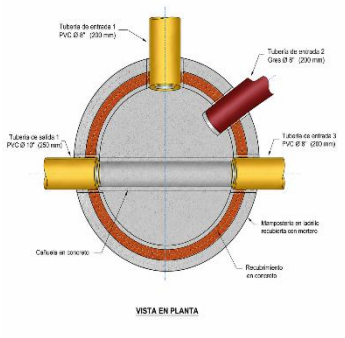

CARACTERÍSTICAS DE LOS DUCTOS

No.	DIÁMETRO (pulgadas)	MATERIAL	COTA CLAVE M.S.N.M.	PROF. (m)	CONEXIÓN	LONG. (m)
1	10	PVC	1027.81	1.39	PZ5	19.02
2	8	PVC	1028.69	0.51	PZ	NR
3	8	Gres	1027.93	1.27	PZ	NR
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

OBSERVACIONES

Durante la inspección de este pozo se logró recopilar la información que fue posible observar en campo. Sin embargo, es importante aclarar que la estructura presentaba un nivel elevado de agua, lo que impidió visualizar el fondo del pozo, la cañuela y la tubería de salida.
Teniendo en cuenta que el PZ-5 presenta una profundidad considerable y que el nivel de agua se mantiene alto sin evidenciar disminución durante la inspección, existe la posibilidad de que la estructura no se encuentre conectada a la red o, alternativamente, que presente algún tipo de taponamiento. No obstante, debido a que no fue posible observar directamente el fondo del pozo, no se cuenta con elementos suficientes para confirmar ninguna de estas condiciones.

Carlos A. Vargas
MAT: 01-1836 CPNT

Juan G. Rincón
MAT: 091037-0666566 CNDB
